



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Liberté

Égalité

Fraternité

Commissariat général au développement
durable (CGDD)



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

NOVAE

*Comité de pilotage
20 juin 2024*

Ordre du jour

- Point sur la situation
- Retour COPIL Intalio
- Présentation du planning de développement
- Proposition d'un scénario de déploiement

Point sur la situation

Rappel du calendrier prévu initialement

- Développement en trois livraisons entre mars et avril
- Validation du produit mi avril
- Déploiement vers la mi-juin

Constat

- La dernière livraison de NOVAE en avril (suite à notre COPIL) comprenait des problèmes de performance important → **il n'était pas possible de valider le produit**
- Les problèmes passés invitaient à la prudence
 - Décision de ne pas prendre le risque de multiples reports


Conséquences

- COPIL le 23/05/2024
 - Déploiement suspendu en attente d'une nouvelle garantie
- **Restructuration du planning en lien avec Intalio**

Nouveau planning de travail

- Finalisation des sujets transverses
- Finalisation de la partie « gestion des demandes » puis développement des interconnexions
 - Sécurisation de l'avancée par des réunions de go/no go fréquents
- Développement de l'interconnexion de GunEnv et de la reprise des données en parallèle après la sécurisation de l'applicatif

Planning Intalio

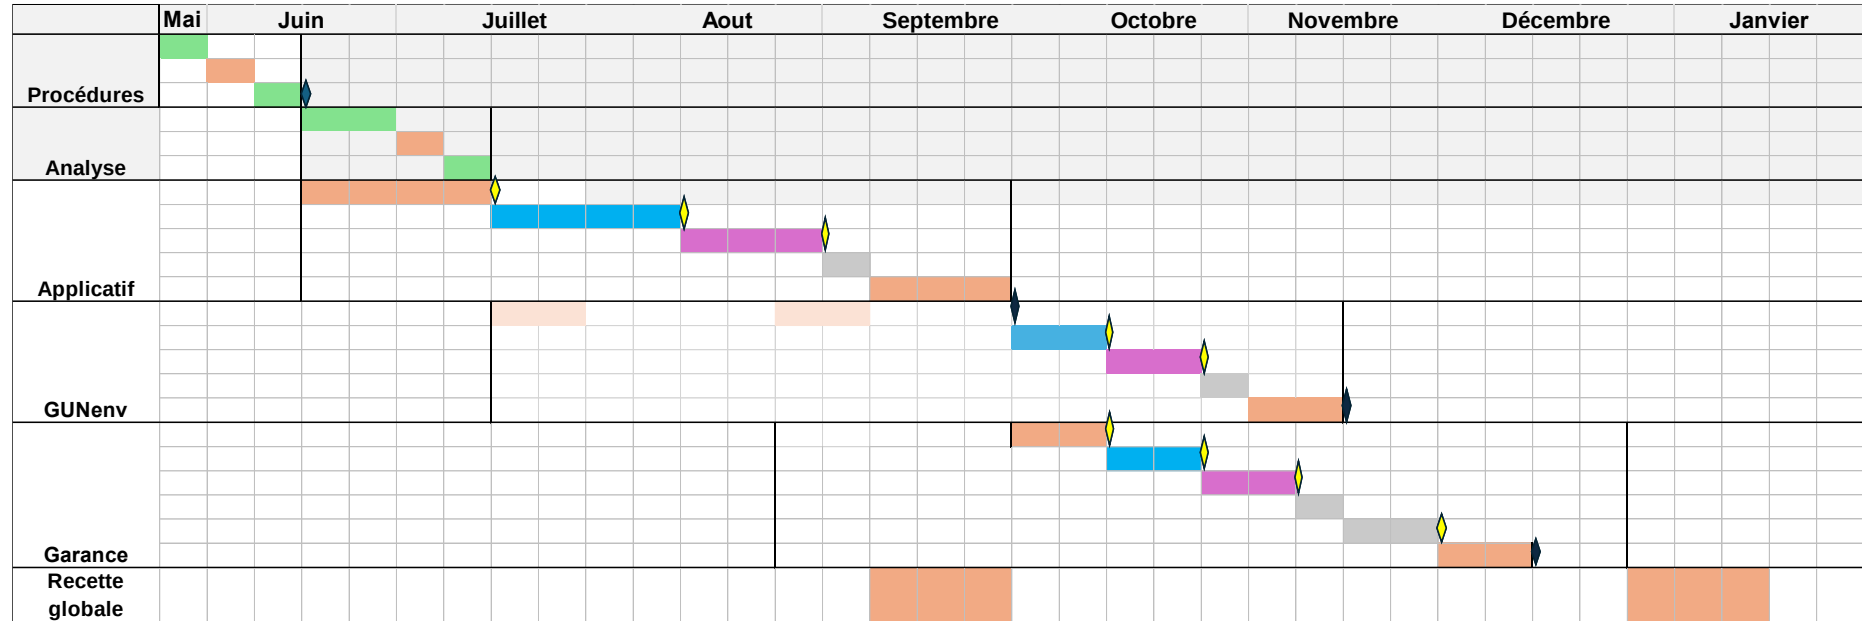

Commentaires planning

Ce planning ne concerne que la phase de développement et n'intègre pas la charge de travail spécifique au déploiement

- Préparation déploiement
- Formations
- Préparation environnement de déploiement

A partir de ce planning, nous pouvons travailler à un scénario de déploiement

Proposition de scénario de déploiement

Un déploiement en deux temps

A la fin de la phase applicative pour les régions pilotes (**automne 2024**) puis au printemps pour les autres régions

Déploiement 1

- Formations à caler autour des vacances de la Toussaint (*cf ateliers utilisateurs « formation »*)
- Déploiement autour de la mi-novembre
- Utilisation de l'outil en mode « pilotes » pendant 4 mois (sans interconnexion Gun Env et reprise de données)


Ajout lors du COPIL

- *Accès à l'environnement de recette dès la configuration, avant les formations. Des guides utilisateurs seront fournis pour accompagner la prise en main*

Déploiement 2

- Formations à partir de mi mars
- Déploiement par vague de 4 régions
- Montée de version pour les sites pilotes

Proposition de scénario de déploiement

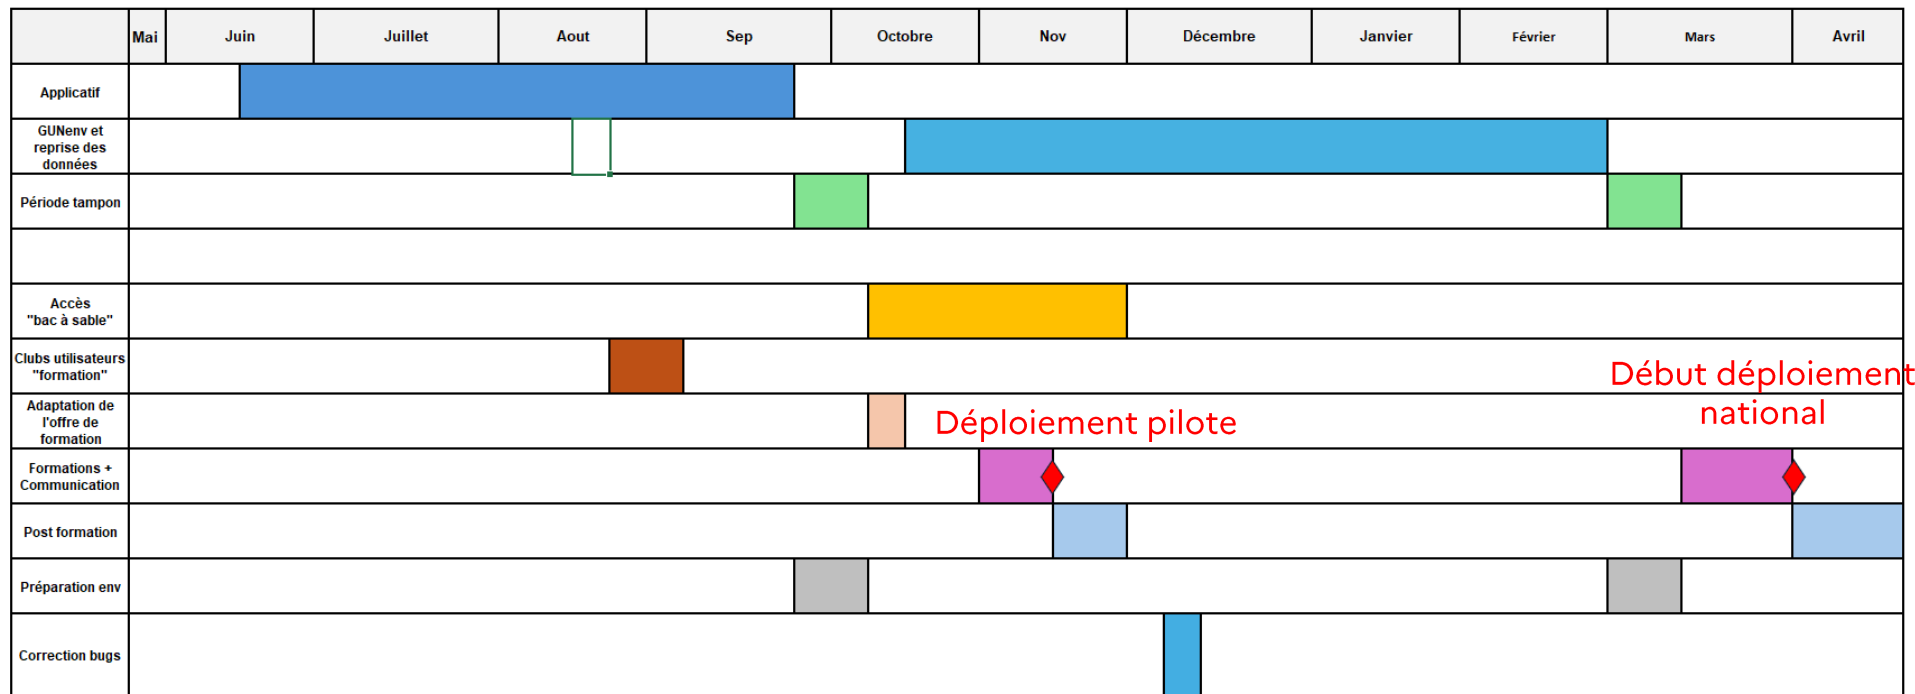

Agenda à venir

- ❑ 4 réunions de go/no go prévues (**12/07, 16/08, 06/09, 13/09**)
 - ❑ Réunions entre Intalio et le CGDD, les rapports sont partagés aux membres du COPIL
- ❑ Finalisation et validation de la partie instruction (télédéclaration, instruction, publication, pilotage et rapportage) **mi-septembre 2024**
- ❑ Clubs utilisateurs formation : **début septembre 2024**
- ❑ Déploiement sites pilotes:
 - ❑ Formation : **octobre/novembre 2024,**
 - ❑ Déploiement : à fixer autour du **11 novembre 2024**
- ❑ Déploiement autres régions
 - ❑ A partir de **mars 2025**
- ❑ Prochain COPIL : **Mardi 17 septembre 14h**
